

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(01/31)



تقرير سير الأعمال لشهر (يناير) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 12م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / يناير)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

الفحص والتسليم

الخدمات

التأثيث

التشطيب

الاعمال العظم

إصدار التراخيص

التعاقد مع المكتب الهندسي

التعاقد مع المقاول

ترسية المشروع

طلب عروض السعر

مراجعة التصميم

مراجعة المخططات

يحدث الآن

أعمال العظم

الاعمال الاسقف

الاجسور

المباني

الاعمدة

صبة نظافة الأرضية

الاعمال الردم

الاعمال العزل

الاعمال الميدات

الاعمال رقاب الأعمدة

خرسانة القواعد

الخرسانة العادية

الاعمال الحفر والإحلال


يحدث الآن

- 01 صب سقفة سقف من الامام والمؤذن.
- 02 حادة اعمدة المحلات.
- 03 اعمال عزل رقاب الجدار الخرساني للمسجد.
- 04 الانتهاء من البلاطة الارضية للمحلات.
- 05 اعمال مباني جدران الوارش في الفلل.


الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية



04

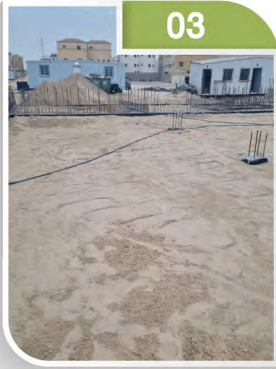

03

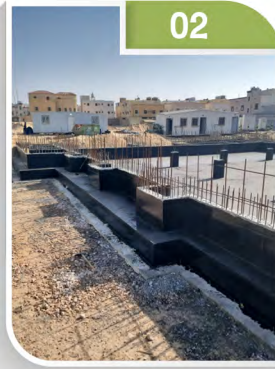

02



01

- 01 اعمال حادة وصوب الميادات.
- 02 نجارة صوب اعمدة المحلات.
- 03 اعمال الطرشرة واللياسة في الفلل.
- 04 اعمال عزل الميدات والدفان في الجامع.
- 05 اعمال حفر وتجهيز المئذنة.

الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)



04



03



02



01



الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
