

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(07 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يوليو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

17 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 10 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يوليو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

الفحص والتسليم

الخدمات

التأثيث

التشطيب

الاعمال العظم

إصدار التراخيص

التعاقد مع المكتب الهندسي

التعاقد مع المقاول

ترسية المشروع

طلب عروض السعر

مراجعة التصميم

مراجعة المخططات

يحدث الآن

أعمال العظم

الاعمال الأسقف

الاعمال الجسور

الاعمال المباني

الاعمال الأعمدة

صبية نظافة الأرضية

الاعمال الردم

الاعمال العزل

الاعمال الميدات

الاعمال رقاب الأعمدة

خرسانة القواعد

الخرسانة العادية

الاعمال الحفر والإحلال


يحدث الآن

يحدث الآن



يحدث الآن

يحدث الآن

- 01 استكمال أعمال تركيب الأسقف المستعارة في الفلل.
 - 02 البدء بأعمال تركيب بلاط الأرضيات والجدران داخل الفلل.
 - 03 أعمال الحفر وطبقة الإحلال في المئذنة، مع البدء بأعمال القاعدة المسلحة للمئذنة.
 - 04 الانتهاء من أعمال صبة الميول في اسطح الفلل.
- ### الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية

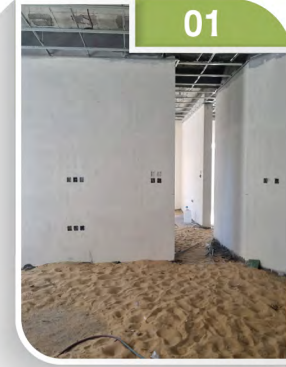

- 01 استكمال وتسليم أعمال تركيب الأسقف المستعارة في الفلل.
 - 02 استكمال أعمال تركيب بلاط الأرضيات والجدران في داخل الفلل.
 - 03 بدء أعمال الطرشة واللياسة في جدران الجامع الداخلية.
 - 04 صب خرسانة قاعدة المئذنة، ثم العزل والدفان.
- ### الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)

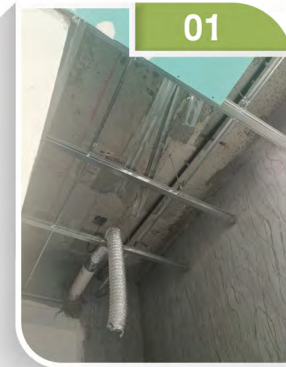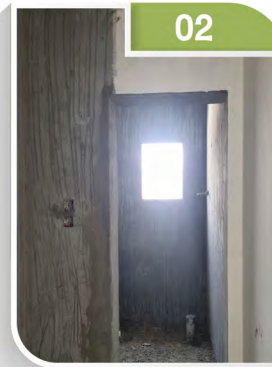

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
