

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(05 / 31)



تقرير سير الأعمال لشهر (مايو) لعام (2026 م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 12 م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18 م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / مايو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصاميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
--------------------	--------------------	----------------------	------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

يحدث الآن

أعمال العظم

أعمال الحفر والإحلال	الخرسانة العادية	الخرسانة القواعد	أعمال رقاب الاعمدة	أعمال الميدات	أعمال العزل	أعمال الردم	صبة نظافة الأرضية	أعمال الاعمدة	أعمال المباني	أعمال الجسور	أعمال الأسقف
----------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	------------------	----------------	----------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------	-----------------



يحدث الآن

يحدث الآن


يحدث الآن

يحدث الآن

- 01 استكمال تصنيع وتركيب الجدران مسبقة الصب.
- 02 أعمال طرشرة ولياسة السور الخارجي.
- 03 الانتهاء من أعمال طرشرة ولياسة واجهات الفلل.
- 04 البدء بأعمال الدهانات الداخلية للفلل.

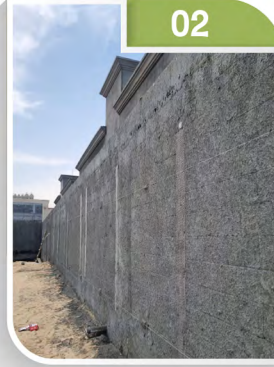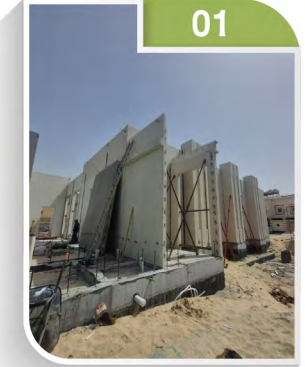

- 01 الانتهاء من أعمال الدهانات الداخلية في الفلل.
- 02 الانتهاء من تصنيع وتركيب الجدران مسبقة الصب.
- 03 أعمال العزل المائي في الفلل.
- 04 أعمال حفر وتأسيس المس المأذنة.
- 05 أعمال مباني الجدران الداخلية في الجامع.

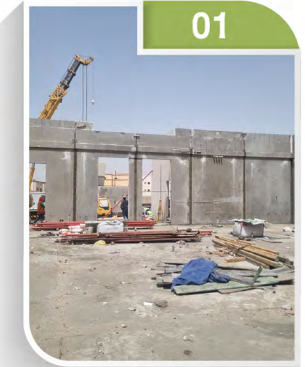

الموقع
الجغرافي
للمشروع



رابط البث
المباشر
للمشروع

اضغط هنا
