

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(06 / 30)



تقرير سير الأعمال لشهر (يونيو) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

14 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 8 / 12م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / يونيو)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

الفحص والتسليم

أعمال الخدمات

أعمال التأثيث

أعمال التشطيب

أعمال العظم

إصدار التراخيص

التعاقد مع المكتب الهندسي

التعاقد مع المقاول

ترسية المشروع

طلب عروض السعر

مراجعة التصميم

مراجعة المخططات

يحدث الآن

أعمال العظم

أعمال الأسقف

أعمال الجسور

أعمال المباني

أعمال الأعمدة

صبة نظافة الأرضية

أعمال الردم

أعمال العزل

أعمال الميدات

أعمال رقاب الأعمدة

خرسانة القواعد

الخرسانة العادية

أعمال الحفر والإحلال


يحدث الآن

يحدث الآن



يحدث الآن

يحدث الآن

- 01 البدء بتركيب الأسقف مسبقة الصب في الجامع.
 - 02 الانتهاء من تصنيع وتركيب الجدران مسبقة الصب.
 - 03 البدء بأعمال العزل المائي في أسطح الفلل والمحلات.
 - 04 استكمال أعمال مباني الجدران الداخلية في الجامع.
- ### الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية

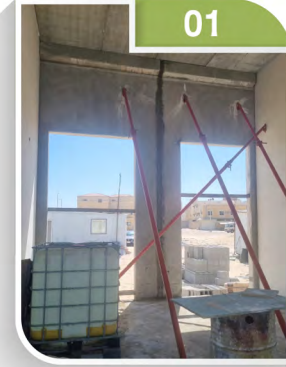

- 01 استكمال وتسليم أعمال تركيب الأسقف المستعارة في الفلل.
 - 02 الانتهاء من تصنيع وتركيب الأسقف مسبقة الصب في الجامع.
 - 03 صب الأعتاب وبدء أعمال الطرشرة واللياسة في جدران الجامع الداخلية.
 - 04 أعمال حفر وتأسيس المئذنة.
 - 05 الانتهاء من أعمال صبة الميول في اسطح الفلل.
- ### الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)

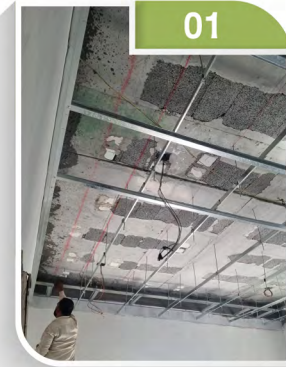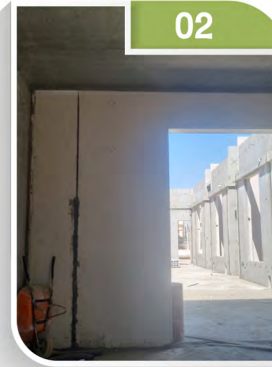

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
