

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

مشروع

تقرير سير الأعمال لشهر (أغسطس) لعام (2026م)

نسبة الإنجاز
حتى تاريخ
(08 / 31)



إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م ²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334 م ²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

مدة المشروع

17 شهراً



تاريخ نهاية المشروع

2026 / 10 / 10م



تاريخ بداية المشروع

2025 / 6 / 18م



المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / أغسطس)



مكونات المشروع



- ✓ مبنى الجامع ومرافقه
- ✓ سكن للإمام
- ✓ سكن للمؤذن
- ✓ مرافق خضراء
- ✓ مواقف سيارات
- ✓ محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات مراجعة التصميمات طلب عروض السعر ترسية المشروع التعاقد مع المقاول التعاقد مع المكتب الهندسي إصدار التراخيص أعمال العظم أعمال التشطيب أعمال التأثيث أعمال الخدمات الفحص والتسليم

يحدث الآن

أعمال التشطيب

أعمال اللباسة الداخلية أعمال اللباسة الخارجية أعمال الدهانات الداخلية أعمال الدهانات الخارجية أعمال العزل المائي والحاراري أعمال الأرضيات أعمال الحوائط أعمال الأسقف الأبواب الألمنيوم

يحدث الآن

يحدث الآن




يحدث الآن

يحدث الآن

يحدث الآن



- 01 استكمال أعمال الدهانات وتركيب البلاط في المناطق الداخلية في الفلل.
- 02 توريد وتركيب أسقف ال TT (Double Tee Slab) في مصلى الرجال في الجامع.
- 03 استكمال أعمال السباكة First fix في دورات مياه الجامع.
- 04 صب خرسانة قاعدة المئذنة ورقاب الجدران، وأعمال العزل.
- 05 توريد الخزانات العلوية والخزانات الأرضية في الفلل.

الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 31 يوم الماضية

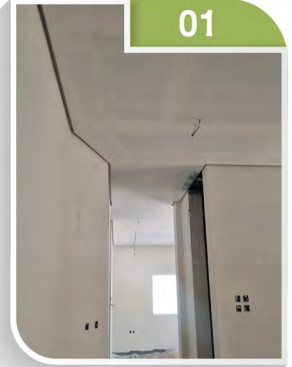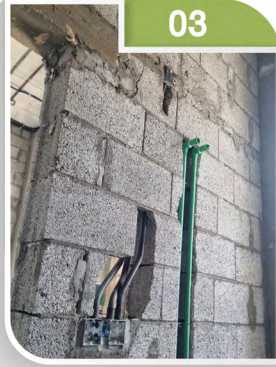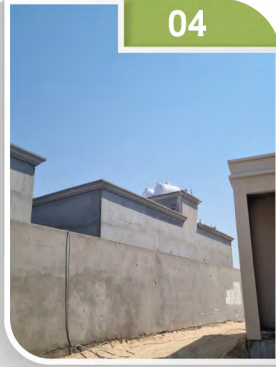

- 01 استكمال أعمال الدهانات وتركيب البلاط في المناطق الداخلية في الفلل.
- 02 استكمال الأعمال الإنشائية في المئذنة، الدفان والدمك ثم البدء بتوريد جدران البريكاست.
- 03 بدء أعمال الطرشة واللياسة في جدران الجامع الداخلية.
- 04 استكمال أعمال الكهرباء في الجامع First fix.
- 05 أعمال توريد وتركيب النوافذ والأبواب في الفلل.

الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)

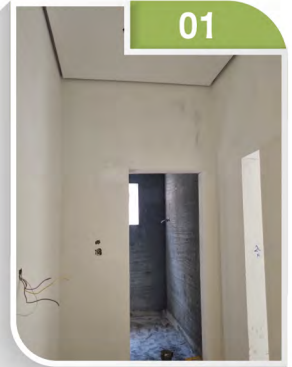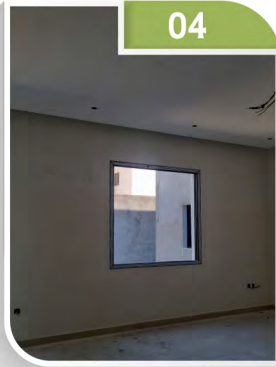

الموقع الجغرافي للمشروع



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا
