يعمر
جمعية يعمر للعناية بالمساجد
Yaamur Association for Mosque Care

مشروع

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

تقرير سير الأعمال لشهر (سبتمبر) لعام (2026م)

نسبة الإنجاز حتى تاريخ (30 / 09)

66%

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334م²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

تاريخ بداية المشروع
18 / 6 / 2025م

تاريخ نهاية المشروع النظامية
31 / 10 / 2026م

المدة الإضافية النظامية
33 يوماً

تاريخ نهاية المشروع المتوقعة
20 / 12 / 2026م

مدة المشروع
14 شهراً

المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (30 / سبتمبر)

يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مكونات المشروع



- مبنى الجامع ومرافقه
- سكن للإمام
- سكن للمؤذن
- مرافق خضراء
- مواقف سيارات
- محلات تجارية وقفية

Yaamurorg

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصاميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
								يحدث الآن			


أعمال التشطيب

أعمال اللياسة الداخلية	أعمال اللياسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألمنيوم
يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن					


الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 30 يوم الماضية

01 استكمال أعمال الدهانات وتركيب البلاط في المناطق الداخلية في الفلل.
02 البدء بأعمال تركيب شاسيهات السقف المستعار في مصلى الرجال.
03 بدء أعمال الطرطشة واللياسة في جدران الجامع الداخلية.
04 استكمال أعمال الكهرباء في الجامع second fix.
05 أعمال توريد وتركيب النوافذ في الفلل.

01

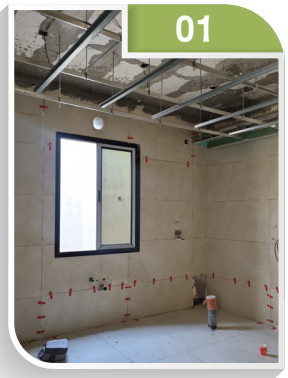


02

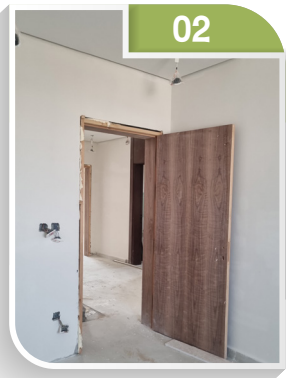

03




04

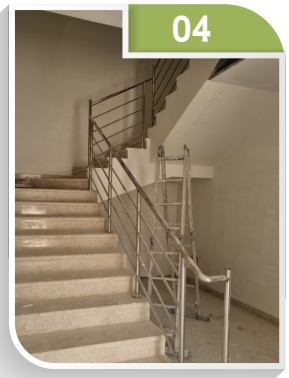

الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 31 يوم القادمة)

01 أعمال الـ GRC في واجهات الفلل.
02 استكمال الأعمال الإنشائية في المئذنة، الدفان والدمك ثم البدء بتوريد جدران البريكاست.
03 استكمال وتسليم أعمال اللياسة في جدران الجامع الداخلية.
04 استكمال أعمال الكهرباء في الجامع second fix.
05 استكمال أعمال تركيب شاسيهات الأسقف المستعارة في الجامع.

01

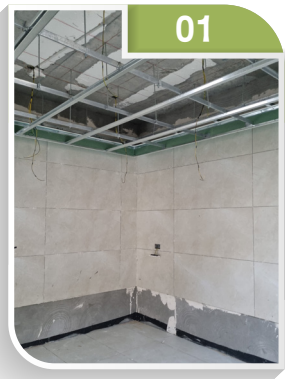


02



03



04

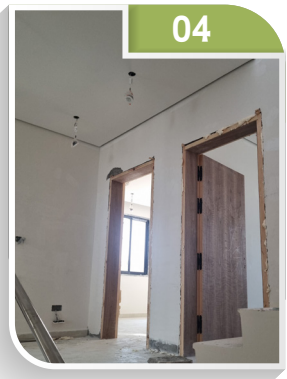

رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع

تنـــويـــــه

- تم منح المقاول مدة إضافية بالمشروع بناءً على وجود أعمال إضافية: المواضئ الخارجية / نظام المياه الرمادية / أعمال تصنيع المنارة.
- سيتم فرض غرامة تأخير على المقاول ابتداءً من تاريخ نهاية المشروع النظامية.



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع
