يعمر
جمعية يعمر للعناية بالمساجد
Yaamur Association for Mosque Care

مشروع

جامع الضاحية

الدمام - حي الضاحية

تقرير سير الأعمال لشهر (أكتوبر) لعام (2026م)

إجمالي مساحة المشروع (الأرض)	2928 م²	عدد المواقف	18
إجمالي مساحة المشروع (المباني)	1334م²	عدد دروات المياه	8
إجمالي عدد المصلين التقريبي	500.00	عدد المحلات الوقفية	4

نسبة الإنجاز حتى تاريخ (10 / 31)



تاريخ بداية المشروع
18 / 6 / 2025م

تاريخ نهاية المشروع النظامية
31 / 10 / 2026م

المدة الإضافية النظامية
70 يوماً

تاريخ نهاية المشروع المتوقعة
20 / 12 / 2026م

مدة المشروع
16 شهراً

المدة الزمنية المنقضية للمشروع حتى تاريخ (31 / أكتوبر)

يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر يناير فبراير مارس أبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

مكونات المشروع



- مبنى الجامع ومرافقه
- سكن للإمام
- سكن للمؤذن
- مرافق خضراء
- مواقف سيارات
- محلات تجارية وقفية

مؤشر انجاز بنود الاعمال

مراجعة المخططات	مراجعة التصاميم	طلب عروض السعر	ترسية المشروع	التعاقد مع المقاول	التعاقد مع المكتب الهندسي	إصدار التراخيص	أعمال العظم	أعمال التشطيب	أعمال التأثيث	أعمال الخدمات	الفحص والتسليم
								يحدث الآن			

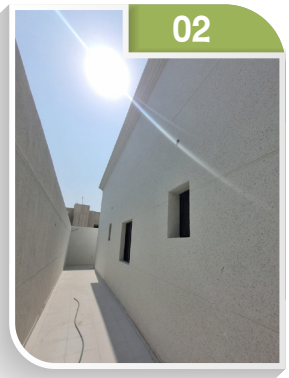
أعمال التشطيب

أعمال اللياسة الداخلية	أعمال اللياسة الخارجية	أعمال الدهانات الداخلية	أعمال الدهانات الخارجية	أعمال العزل المائي والحراري	أعمال الأرضيات	أعمال الحوائط	أعمال الأسقف	أعمال الأبواب	أعمال الألمنيوم
					يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن	يحدث الآن

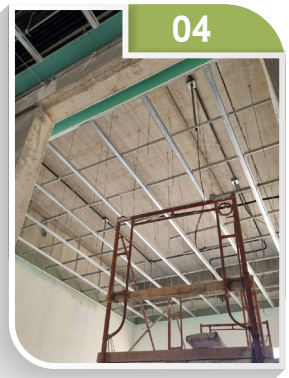
الأعمال التي تم الإنتهاء منها خلال الـ 31 يوم الماضية

01 أعمال ال GRC في واجهات الفلل.
02 أعمال الدهانات الخارجية في الفلل.
03 أعمال تركيب بلاط ارضيات الأحواش ورخام المداخل في الفلل.
04 استكمال أعمال الكهرباء في الجامع second fix.
05 استكمال أعمال تركيب شاسيهات الأسقف المستعارة في الجامع.

01


02


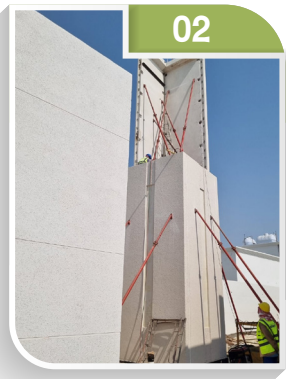
03

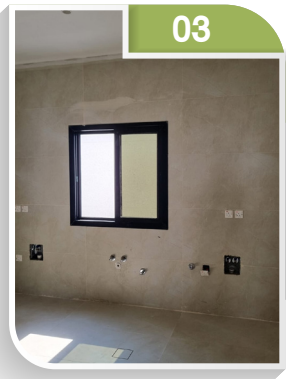

04


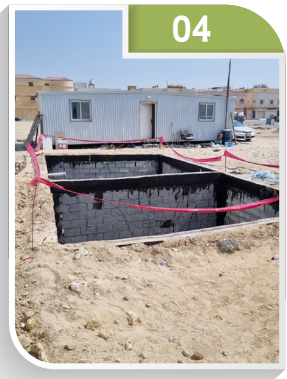
الأعمال الجاري تنفيذها خلال الشهر الحالي (الـ 30 يوم القادمة)

01 أعمال بلاط الأرضيات في المسجد.
02 أعمال بريكاست المئذنة.
03 استكمال أعمال الكهرباء في الفلل Third fix.
04 أعمال تركيب الأسقف المستعارة في الجامع.
05 أعمال توريد وتركيب الخزانات الأرضية مع الدفان.

01


02


03


04


رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع

تنـــويـــــه

- تم منح المقاول مدة إضافية بالمشروع بناءً على وجود أعمال إضافية: المواضئ الخارجية / نظام المياه الرمادية / أعمال تصنيع المنارة.
- سيتم فرض غرامة تأخير على المقاول ابتداءً من تاريخ نهاية المشروع النظامية.



رابط البث المباشر للمشروع

اضغط هنا

الموقع الجغرافي للمشروع
